Planning HOV Verkenning- en studie fase

Versie 2.4

Id	Taaknaam	Begindatum	Einddatum	Duur	% voltooid
95	**VERKENNINGSFASE**				**92%**
110	**REGIONAAL/LOKAAL BESLUITVORMINGSTRAJECT t.b.v. definitieve voorkeur**	**maa 18/04/22**	**woe 14/06/23**	**60.4 wkn**	**85%**
111	**Bestuurlijke overleggen**	**maa 18/04/22**	**din 13/06/23**	**60.4 wkn**	**100%**
119	**Besluitvorming Masterplan t/m Raad Gemeente Den Haag**	**din 14/02/23**	**don 25/05/23**	**14.4 wkn**	**30%**
135	**Bestuursovereenkomst (BOK)**	**woe 14/06/23**	**woe 14/06/23**	**0 wkn**	**0%**
137	**Plan van Aanpak uitwerkingsfase**	**woe 30/11/22**	**woe 14/06/23**	**28 wkn**	**52%**
142	**PLANNING- EN STUDIEFASE**	**maa 09/01/**	**maa 06/08/2**	**343.2 wkn**	**1%**
143	**Projectorganisatie**	**woe 03/05/23**	**din 11/07/23**	**10 wkn**	**0%**
144	Marktuitvraag inhuur	woe 03/05/23	woe 14/06/23	6 wkn	0%
145	Installeren nieuwe organisatie	woe 14/06/23	din 11/07/23	4 wkn	0%
146	**OMGEVING**	**woe 12/07/23**	**vri 21/11/25**	**123.6 wkn**	**0%**
147	**Opstellen omgevings- en participatieplan**	**woe 12/07/23**	**vri 21/11/25**	**123.6 wkn**	**0%**
148	Uitwerking aanpak, fasering en planning	woe 12/07/23	woe 11/10/23	3 mndn	0%
149	Review door opdrachtgevers	don 12/10/23	woe 08/11/23	4 wkn	0%
150	**Participatie**	**don 09/11/23**	**vri 21/11/25**	**106.4 wkn**	**0%**
151	Instellen/voorbereiden ateliers	don 09/11/23	din 09/01/24	2 mndn	0%
152	Ateliers cocreatie tijdens ontwerpproces (doorlopend)	maa 22/01/24	vri 21/11/25	21.82 mndn	0%
153	**Opstellen/aanpassen Stakeholdersanalyse**	**woe 12/07/23**	**vri 21/11/25**	**123.6 wkn**	**0%**
154	Actualiseren stakeholdersanalyse	woe 12/07/23	vri 10/11/23	4 mndn	0%
155	Opstellen en actualiseren KES (doorlopend)	maa 27/11/23	vri 21/11/25	23.64 mndn	0%
156	**Communicatie**	**woe 12/07/23**	**vri 21/11/25**	**123.6 wkn**	**0%**
157	Opstellen communicatiestrategie (afstemming Binckhorst)	woe 12/07/23	woe 11/10/23	3 mndn	0%
158	Communicatie (doorlopend)	maa 30/10/23	vri 21/11/25	24.55 mndn	0%
159	**Technisch-inhoudelijke werkzaamheden**	**woe 14/06/23**	**vri 21/11/25**	**127.6 wkn**	**0%**
160	**Contractering ingenieursbureau t.b.v. opstellen ontwerp**	**woe 14/06/23**	**don 16/05/24**	**48.4 wkn**	**0%**
161	Contractering/aanbesteding ingenieursbureau (doorlooptijd afh. aanbested.vorm)	woe 14/06/23	din 14/11/23	5 mndn	0%
162	Opstellen Contracteringsplan Aanlegfase	woe 15/11/23	don 16/05/24	6 mndn	0%
163	**Opstellen PVE**	**woe 15/11/23**	**vri 15/03/24**	**17.6 wkn**	**0%**
164	Opstellen functioneel PVE	woe 15/11/23	vri 15/03/24	4 mndn	0%
165	**Technische uitwerking ontwerp**	**maa 18/03/24**	**woe 21/05/25**	**61.6 wkn**	**0%**
166	Opstellen VO+ (incl. kostenraming)	maa 18/03/24	woe 21/05/25	14 mndn	0%
167	**Vaststelling VO+**	**don 22/05/25**	**vri 21/11/25**	**26.4 wkn**	**0%**
168	Ter inzagelegging VO+	don 22/05/25	maa 22/09/25	4 mndn	0%
169	Besluitvorming	din 23/09/25	vri 21/11/25	2 mndn	0%
170	**PLANPROCEDURES EN CONDITIONERING**	**maa 09/01/23**	**maa 06/08/29**	**343.2 wkn**	**1%**
171	**Vergunning en procedures**	**woe 15/11/23**	**don 16/05/24**	**26.4 wkn**	**0%**
172	Opstellen inventarisatie benodigde vergunningen	woe 15/11/23	vri 15/03/24	4 mndn	0%
173	Uitvoeren technisch inhoudelijke onderzoeken	woe 15/11/23	don 16/05/24	6 mndn	0%
174	**Planologische procedures (let op samenhang Binckhorst, Lekstraat, etc.)**	**maa 09/01/23**	**vri 22/10/27**	**250 wkn**	**1%**
175	Uitgangspunten definiëren	maa 09/01/23	maa 10/04/23	3 mndn	58%
176	**Omgevingsplan 2.0 BINCKHORST opstellen gebiedsvisie + voorkeursscenario**	**woe 12/07/23**	**woe 15/01/25**	**79.2 wkn**	**0%**
179	**Ontwerp-omgevingsplan Binckhorst 2.0**	**din 22/10/24**	**vri 22/10/27**	**156.8 wkn**	**0%**
180	**Opstellen ontwerp-omgevingsplan**	**din 22/10/24**	**maa 20/10/25**	**52 wkn**	**0%**
184	**Opstellen/toetsen MER**	**din 22/10/24**	**maa 15/12/25**	**60 wkn**	**0%**
190	**Ontwerp t/m vrijgave til omgevingsplan + MER**	**din 21/10/25**	**woe 11/03/26**	**20.4 wkn**	**0%**
199	**TIL + Vaststellen omgevingsplan**	**don 12/03/26**	**vri 31/07/26**	**20.4 wkn**	**0%**
212	**In werking treden omgevingsplan bij geen beroep of wel beroep geen Vo**	**maa 03/08/26**	**vri 23/10/26**	**12 wkn**	**0%**
217	**Risico: Beroep aanname 1 jaar**	maa 26/10/26	vri 22/10/27	52 wkn	0%
218	**Omgevingsplan/best.plan Lekstraat e.o**	**woe 12/07/23**	**vri 23/10/26**	**171.6 wkn**	**0%**
219	Procedure nader te bepalen (Gebiedsgrens, samenhang Binckhorst etc.)	woe 12/07/23	vri 23/10/26	39 mndn	0%
220	**Grondverwerving**	**woe 12/07/23**	**woe 01/12/27**	**229.2 wkn**	**0%**
221	Actualiseren Inventarisatie grondeigendomssituatie	woe 12/07/23	woe 11/10/23	3 mndn	0%
222	Opstellen verwervingsstrategie	don 12/10/23	maa 12/02/24	4 mndn	0%
223	Verkennende gesprekken/anticiperende verwervingen (let op communicatiememomenten proces!)	din 13/02/24	maa 20/10/25	20 mndn	0%
224	Minnelijke verwerving obv vastgesteld VO (let op communicatiememomenten proces!)	maa 24/11/25	woe 01/12/27	24 mndn	0%
225	**Kabels en Leidingen (ondergrondse infra)**	**maa 13/02/23**	**maa 06/08/29**	**338.2 wkn**	**1%**
226	Inventarisatie kabels en leidingen	maa 13/02/23	vri 30/06/23	20 wkn	13%
227	Afstemming beheerders kabels en leidingen	don 16/01/25	din 20/01/26	12 mndn	0%
228	Opstellen plan van aanpak per om te leggen cluster	woe 21/01/26	maa 25/01/27	12 mndn	0%
229	Voorbereidingstijd nutsbedrijven	din 26/01/27	vri 28/01/28	12 mndn	0%
230	Uitvoeringstijd nutsbedrijven	maa 31/01/28	maa 06/08/29	18 mndn	0%
231	PROJECTBESLISSING PLANNINGS- EN STUDIEFASE	vri 21/11/25	vri 21/11/25	0 wkn	0%
232	**AANLEGFASE**	**maa 26/10/**	**vri 19/10/29**	**156 wkn**	**0%**
234	**Vroegste start onteigening (obv onherroepelijk OP en projectbeslissing)**	**maa 26/10/26**	**vri 19/10/29**	**156 wkn**	**0%**
237	Aanname doorlooptijd 2 a 3 jaar	maa 26/10/26	vri 19/10/29	156 wkn	0%

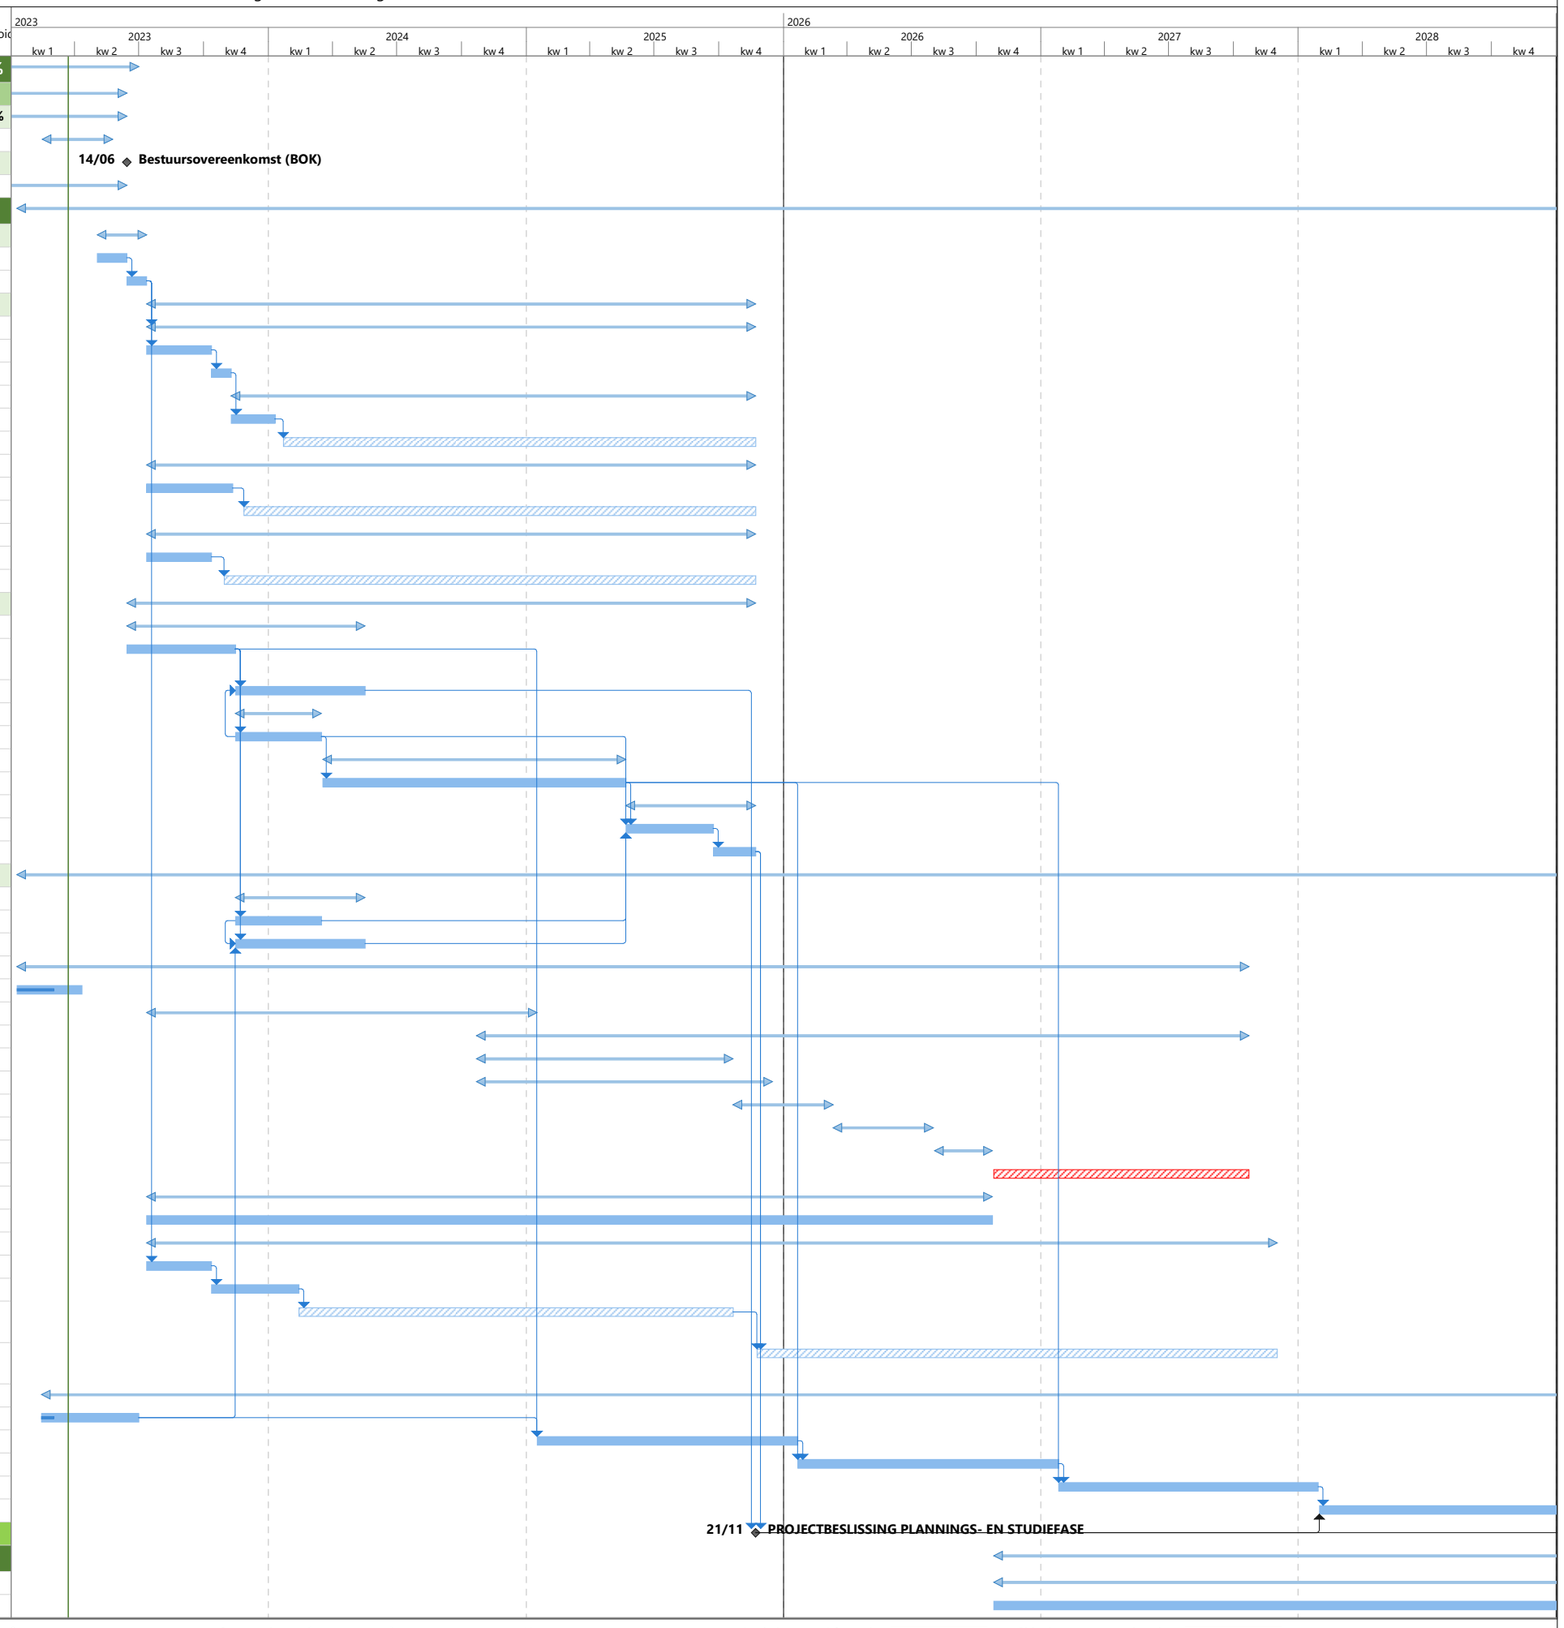

Project: HOV MIRT planning- en studiefase
Datum: don 23/03/23
Versie 2.4, opgesteld door K. Koedood

Den Haag

Taak | Mijlpaal | Samenvatting | Voortgang | Aandachtspunten/afstemming | Risico beroep op omgevingsplan

CONCEPT aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend
